



ALPHA EDTECH

☰ PLANEJAMENTO DE INTEGRAÇÃO — GRUPO 5

Próximos Passos: Roadmap Frontend

Cronograma de integração, definição de responsabilidades
e fluxo de trabalho para a conclusão do MVP.

👤 GRUPO 5 | 📅 PROJETO OMNICONNECT

Onde Estamos

O time de frontend está concluindo a implementação das telas estáticas do app. Essa fase cobre as **screens** e **widgets** de cada funcionalidade, sem ainda conectar dados reais.

Após a entrega da branch de telas, iniciamos a fase de integração: conectar o visual ao backend real.

Cronograma de Integração

Etapa 1 — Consolidação da Entrega (Mauricio)

Após receber a branch com todas as telas, o Mauricio irá realizar o merge do código, atualizar a documentação e finalizar o tema visual do app.

- ✔ Definição de cores, fontes e estilos globais.
- ✔ Mapeamento de todas as rotas de navegação.

Resultado: App com todas as telas navegáveis e visual corrigido.

Etapa 2 — Domain Layer (Mauricio)

Implementação dos **contratos** (Entities e Interfaces) que definem o que o app precisa fazer.

- ✔ **Entities:** Objetos centrais (User, Conversation, Contact).
- ✔ **Use Cases:** Lógica das operações de negócio.

Resultado: Especificação funcional completa da lógica da feature.

Etapa 3 — Models e DataSources (Mauricio)

Implementação da comunicação técnica com a API.

- ✔ **Models:** Tradução de JSON para objetos Dart.
- ✔ **DataSources:** Chamadas HTTP reais aos endpoints.

Resultado: Uma "SDK interna" pronta para consumo pelo frontend.

Etapa 4 — Repository Implementations (Lucas e Alan)

Implementação da "cola" entre as camadas utilizando os contratos prontos.

- ✔ Conexão entre DataSources e Interfaces de Repositório.
- ✔ Padronização de erros e tratamento de falhas.

Resultado: Camada de dados funcional e resiliente.

Etapa 5 — Providers e Conexão da UI (Lucas e Alan)

Substituição dos dados estáticos por dados reais da API.


- ✔ **Riverpod:** Gestão de estado (loading, success, error).
- ✔ **Conexão:** Telas reagem aos dados providos pelos Repositories.

Resultado: App funcional com integração real ao backend.

Validação e Qualidade

- ✔ **Etapa 6 — Revisão E2E (Mauricio):** Teste do fluxo completo, desde o login até as features principais, garantindo que não há "pontas soltas".
- ✔ **Etapa 7 — QA (Thiago):** Testes de qualidade rigorosos, validação de perfis (Cliente vs Advogado) e registro de bugs no Linear.

Resumo Visual do Fluxo

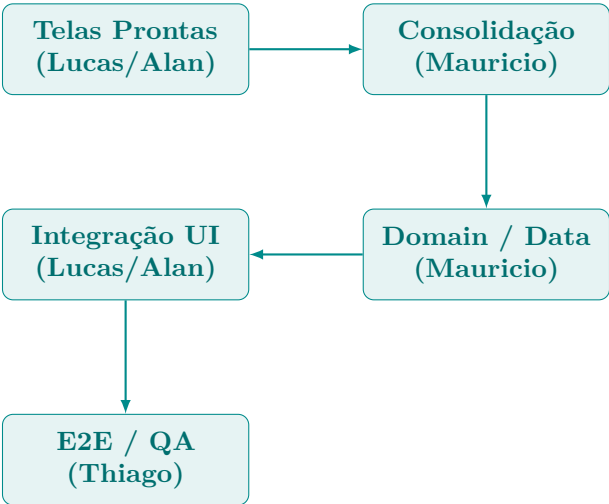

Matriz de Responsabilidades

Etapa	Responsável	Dependência
Consolidação, rotas	Mauricio	Brach de telas entregue.
Domain & Data	Mauricio	Consolidação concluída.
Implementação Repos	Lucas e Alan	Models prontos.
Conexão UI	Lucas e Alan	Repos funcionais.
Revisão E2E	Mauricio	UI conectada.
QA e Testes	Thiago	Revisão E2E ok.

[Importante] Qualquer dúvida durante a implementação, consultar o roadmap completo disponível em `.agents/mobile-implementation-roadmap.md` no repositório.
